



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГИМНАЗИЯ №4 имени М.А. ХАБИЧЕВА»**

369200, г. Карачаевск, ул. Ленина, 45а. тел./факс: 2-32-15
электронный адрес: gimnaziya4@mail.ru

Отчёт .

1. Общая информация.

Согласно распоряжению администрации КГО от 20 марта 2025 г № 74-р «О переводе МБОУ КГО «Гимназия №4 им. М.А. Хабичева» в рамках проведения капитального ремонта с 1 апреля 2025 г образовательный процесс организован в МБОУ КГО «Средняя школа №3 им. Х.У.Богатырёва»

Адрес нахождения: 369200, г. Карачаевск, ул. Магометова, д.1.

Создан штаб контроля из числа родителей за организацией и проведением капитального ремонта.

Ремонтные работы начаты с 26 марта 2025 года. О ходе работ на сайте школы еженедельно помещается информация

На сайте имеется отдельная страница

<https://gimnaziya4kgo.ru/Капитальный-ремонт-2025-г/>

На сайте имеется следующая информация:

Приказ Минпросвещения и Минстроительства и ЖКХ РФ № 15/25 от 19.01.2022 "Об утверждении программы "Модернизация школьных систем образования"

Перечень работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений (школ)

Письмо министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 11.03.2022 № 03-296 «О методических рекомендациях»

Письмо министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 29.10.2021 № 03-1820 «О направлении рекомендаций»

График реализаций мероприятий по капитальному ремонту

Распоряжение Администрации Карачаевского городского округа.

Изданы приказы на школьном уровне:

Дорожная карта.

Приказ об организации непрерывного образовательного процесса в 2025 году.

Приказ МБОУ КГО "Гимназия №4 им. М.А.Хабичева" «О создании Штаба родительского контроля по проведению капитального ремонта школы в 2025 году»

Положение об организации образовательного процесса на 2025 учебный год

О назначении ответственных лиц по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта

О создании школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ

Заключен договор о совместной работе с МБОУ КГО «Средняя школа №3 им. Х.У.Богатырёва»

2. Информация по ремонту.

Информация <https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0379500000925000010>

Объект закупки - Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ КГО "Гимназия №4 им. М. А. Хабичева

Организация, осуществляющая размещение - Республиканское государственное бюджетное учреждение "дирекция капитального строительства"

Почтовый адрес 369000, Карачаево-Черкесская республика,

г.о. Черкесский, г . Черкесск, ул. Советская, д. 67

Место нахождения 369000, Карачаево-Черкесская республика,

г.о. Черкесский, г Черкесск, ул Советская, д. 67

Ответственное должностное лицо Матакаева Ф. Х.

Адрес электронной почты direkciya_kchr@mail.ru

Номер контактного телефона 8-8782-267616

Начальная (максимальная) цена контракта 107 576 581,14

Валюта - российский рубль

Размер аванса, %30,00

Идентификационный код закупки (ИКЗ)252090001293009000100100110020000243

Информация об объекте закупки

КОД ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО (ОБЪЕМ РАБОТЫ, УСЛУГИ)	ЦЕНА ЗА ЕД., Р	СТОИМОСТЬ, Р
71.12.12 <u>71.12.12.000-00000008</u>	Разработка проектной документации объекта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	Условная единица	1,00	1 714 850,00	1 714 850,00
71.20.19.111	Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации	Штука	1,00	162 120,68	162 120,68
41.20.40 <u>41.20.40.000-00000020</u>	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	Условная единица	1,00	105 699 610,46	105 699 610,46

Итого (3 записей): 107 576 581,14 Р

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания срока подачи заявок 27.02.2025 08:00

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 03.03.2025

Срок окончания ремонта - 29.12.2025г

Итоговые результаты.

Государственный контракт № 25-030 от 11.03.2025 г

Заказчик: Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Карачаево- Черкесской республики в лице республиканского государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства»
369 000, Карачаево- Черкесская республика, г. Черкесск , ул. Советская, 67

Подрядчик :

ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС ПЛЮС»,ИНН: 0917036488, БИК: 040702615,
369 000, Карачаево- Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Октябрьская , дом 301А, офис 411

Капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания в 2025 г осуществляется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и регионального проекта «Всё лучшее детям» сроком в один год.

26 марта 2025 г освободили помещение школы для ремонтных работ .

Объём выполненных работ на 19 июня 2025 г .

Подрядчик приступил к работе 26 марта 2025 г .

Проведён демонтаж : отопительной системы, дверей , полов всей школы , штукатурка отбита до кирпича на третьем, втором и 80 % на первом этаже .

Отбита штукатурка на боковой и центральной лестнице с 3 по 1 этаж .

По коридорам и классам 3 этажа электрика разведена полностью , частично - на втором этаже (70%) .

Проведен демонтаж крыши 2 корпуса , выставлен каркас кровли 2 корпуса, кровля второго корпуса, кроме желобов, полностью накрыта.

Кровля первого корпуса полностью демонтирована.

Вывезен строительный мусор и очищены помещения 1, 2 и 3 этажа главного корпуса . На 1 этаже идут работы по демонтажу штукатурки. Завезён материал (газоблоки и цемент) для уменьшения дверных проёмов в классах. На 3 этаже дверные проёмы заложены до нужного размера. На двух переходах производится монтаж балок под кровлю . На одном из переходов подшит карниз . В главном корпусе на 3 этаже Выставляются маяки под штукатурку. В подвале идет демонтаж старого отопления. В главном корпусе на крыше из блоков выставляются блоки под кровлю.

Составлены :

- акт о передаче демонтированного материала (радиаторов в полном объёме) ;
 - акты , фиксирующие показания электроэнергии и водомера на момент начала работ подрядчика.
- Составлена предварительная заявка на оснащение средствами обучения и воспитания.

3.Приложение (фото)


















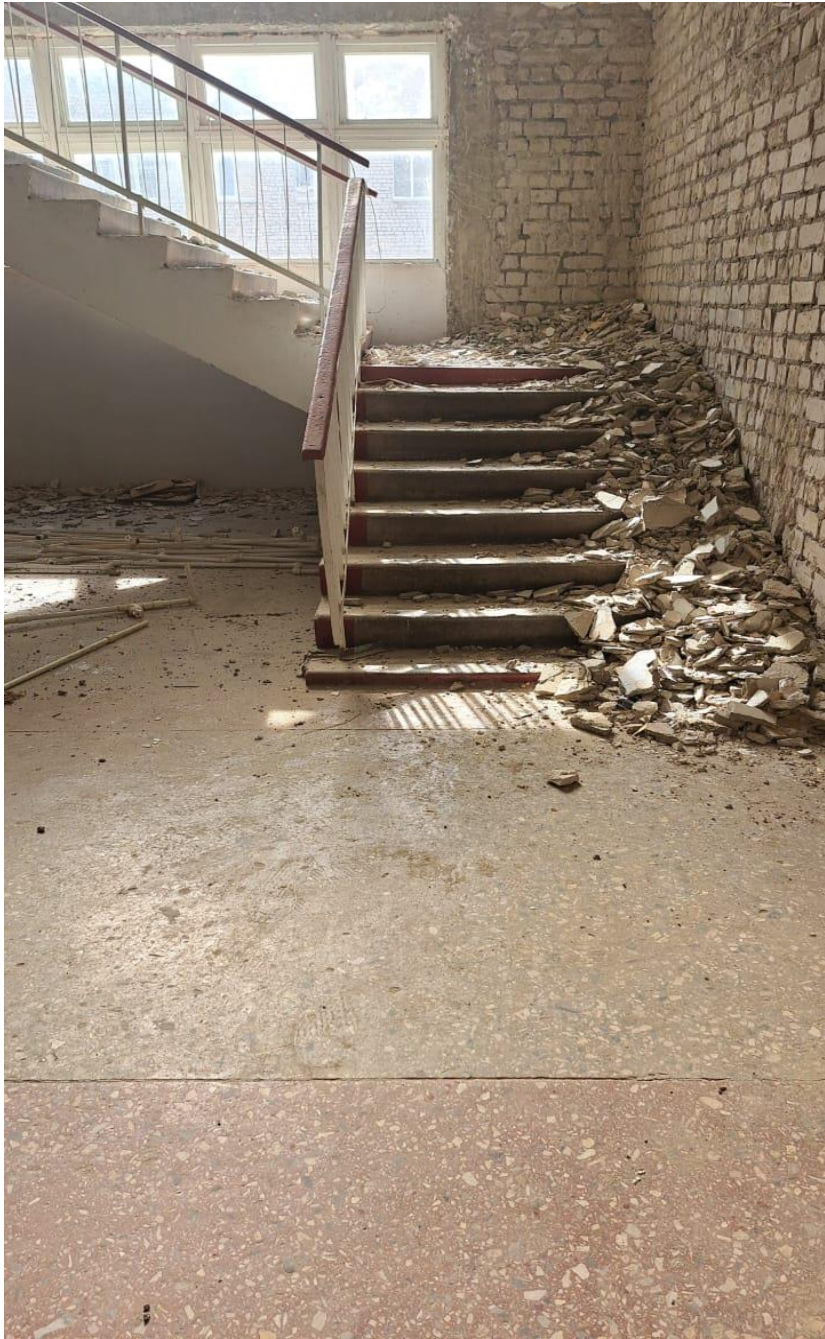





Директор _____



И.Х.Кумукова

